LEYENDA:
Colocación de muros, vigas, forjados y escaleras prefabricados
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ
Colocación de balcones off site
Colocación de paneles de fachada

Viguetas Navarras

60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN GALDAKAO

Ref. cal.: 220167 Fecha: 25/02/2022 Versión: 001.01

VN SYSTEM
Sistema de construcción industrializada

1 GRÚA + 1 EQUIPO DE 3 PERSONAS

EQUIPO DE MONTAJE:

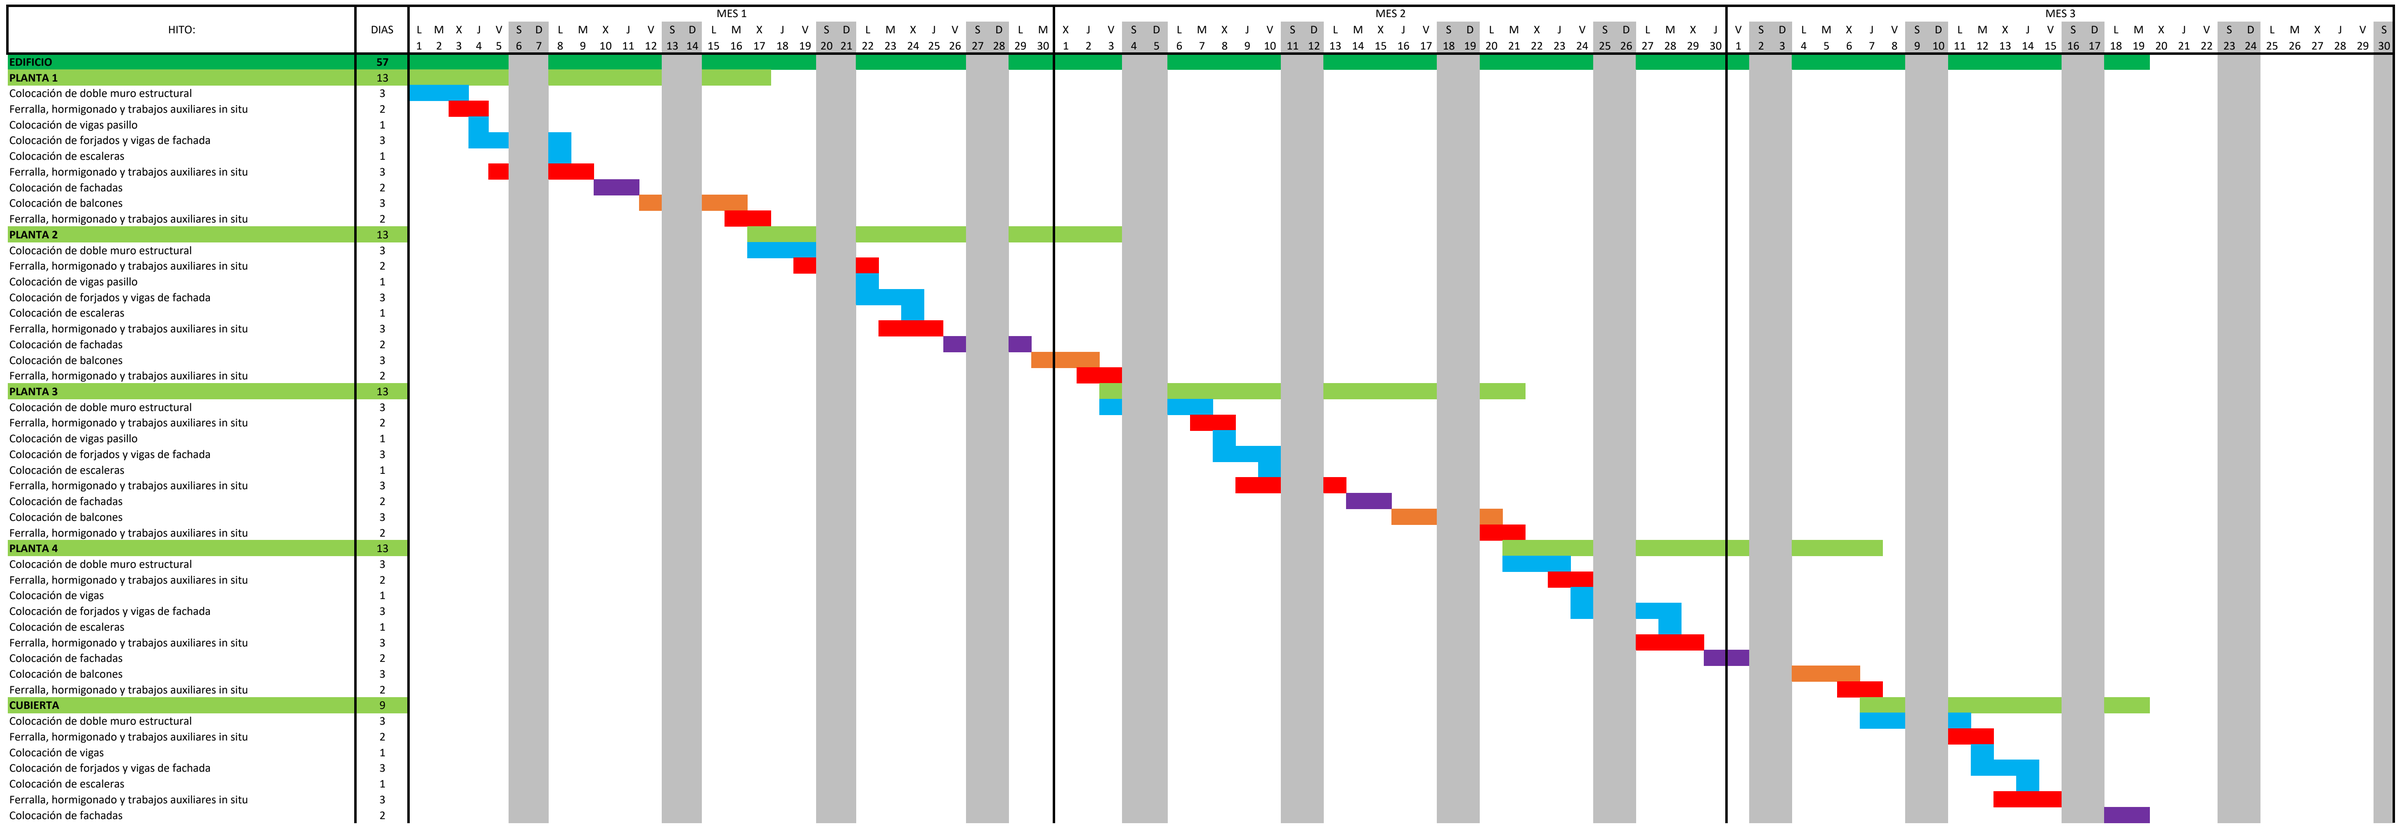

LEYENDA:
Colocación de muros, vigas, forjados y escaleras prefabricados
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ
Colocación de balcones off site
Colocación de paneles de fachada

Viguetas Navarras

60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN GALDAKAO

Ref. cal.: 220167 Fecha: 25/02/2022 Versión: 001.01

VN SYSTEM
Sistema de construcción industrializada

2 GRÚAS + 2 EQUIPOS CON 6 PERSONAS

EQUIPO DE MONTAJE:
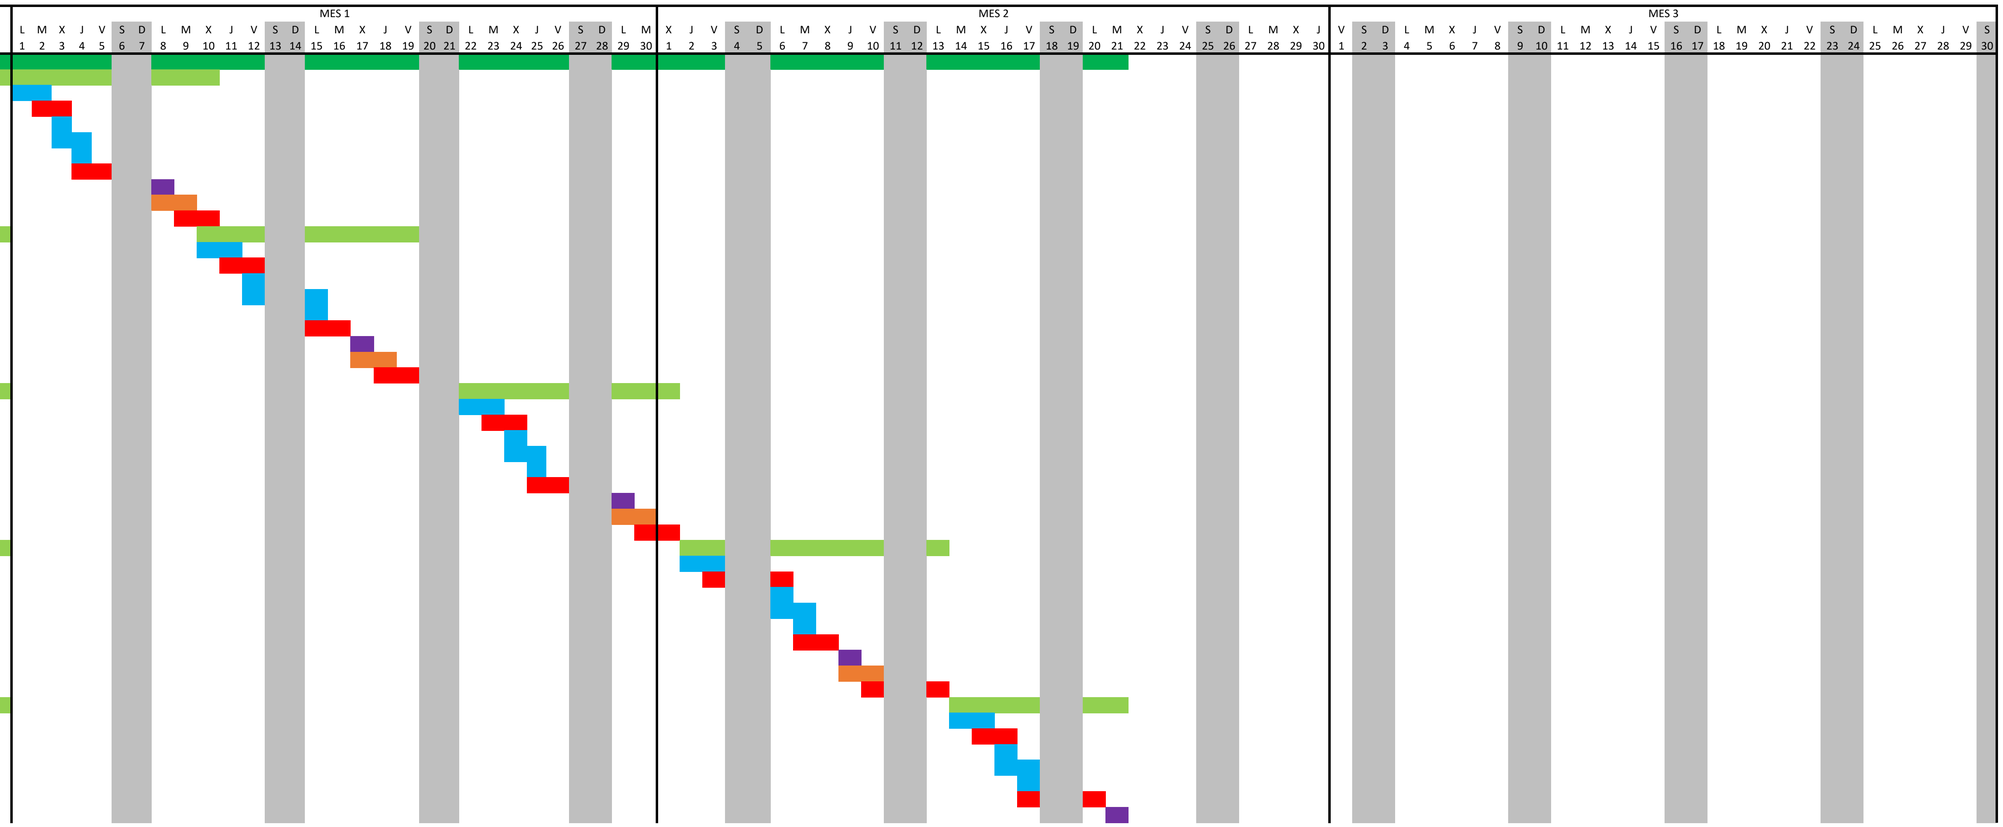
HITO:	DIAS
EDIFICIO	37
PLANTA 1	8
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	1
Colocación de balcones	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
PLANTA 2	8
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	1
Colocación de balcones	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
PLANTA 3	8
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	1
Colocación de balcones	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
PLANTA 4	8
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	1
Colocación de balcones	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
CUBIERTA	6
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	1
