LEYENDA:
- Colocación de muros, vigas, forjados y escaleras prefabricados
- Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ
- Colocación de balcones off site
- Colocación de paneles de fachada

220227 - RESIDENCIA ESTUDIANTES ARROSADIA

VN SYSTEM
Sistema de construcción industrializada

2 GRÚAS + 2 EQUIPOS CON 6 PERSONAS

Ref. cal.: 220227   Fecha: 17/03/2022   Versión: 001.01

EQUIPO DE MONTAJE:
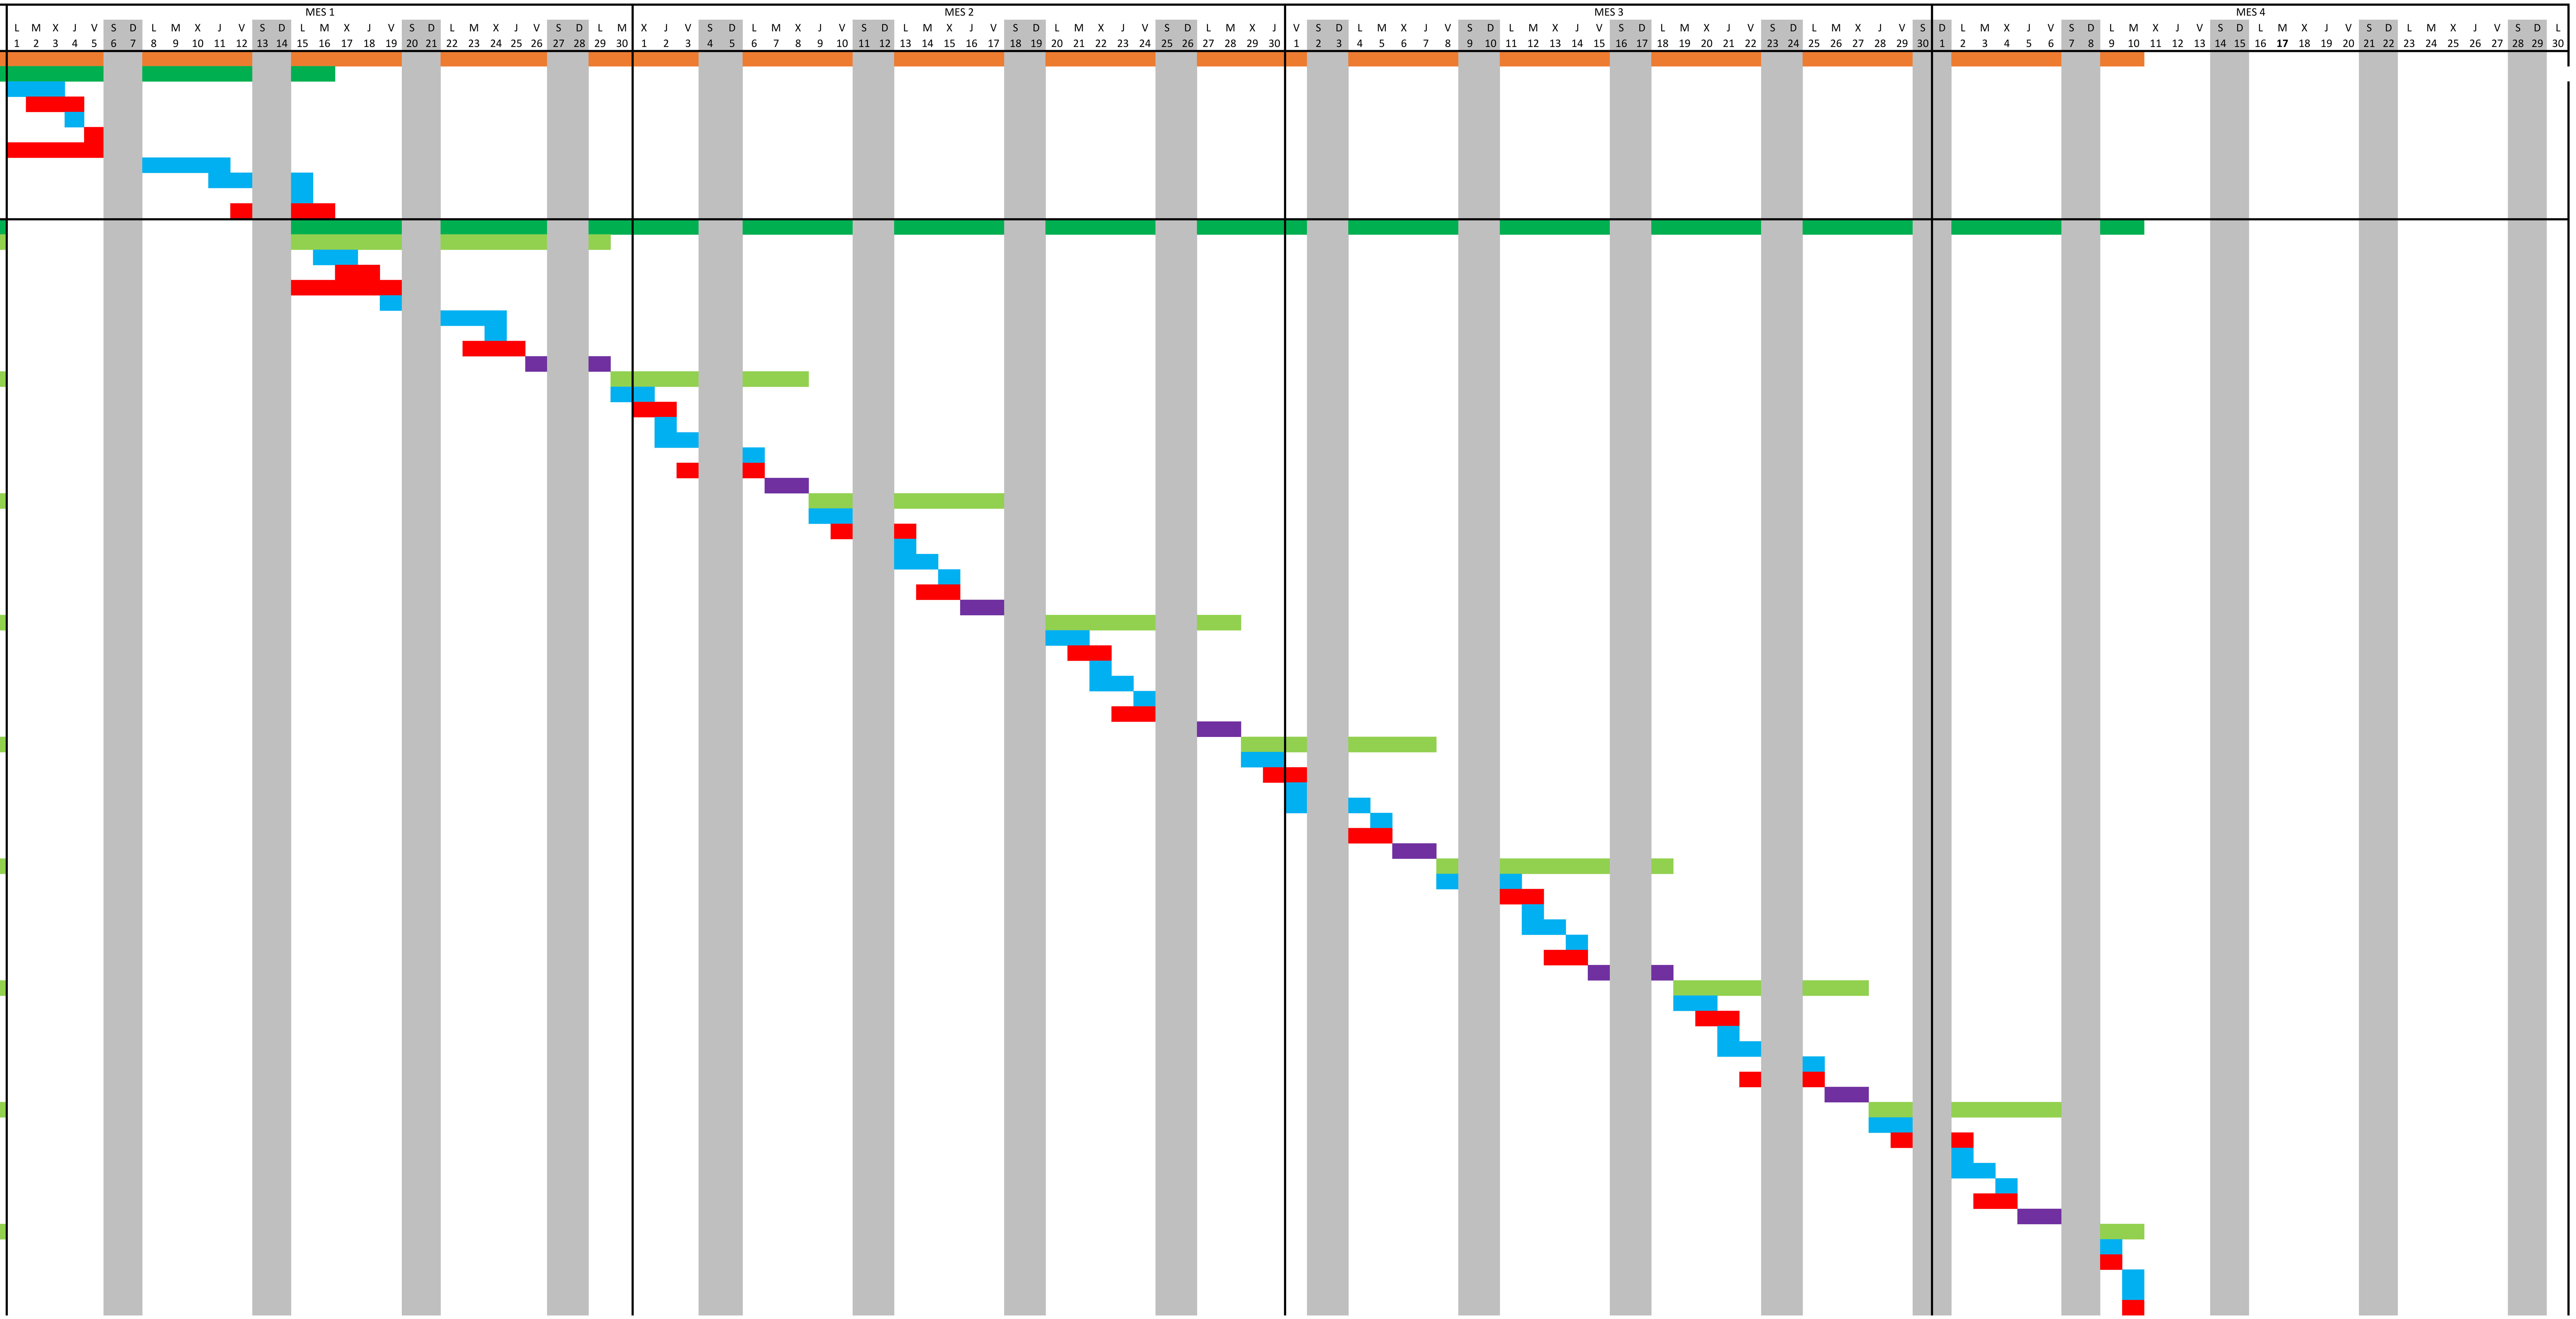
HITO:	DIAS
ESTRUCTURA COMPLETA	72
TECHO DE SOTANO	12
Colocación doble muro perimetral de sótano	3
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	3
Colocación doble muro estructural interiores	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	1
Encofrado, ferralla y hormigonado pilares in situ	5
Colocación de vigas	4
Colocación de forjados	3
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	3
PLANTAS ELEVADAS	62
PLANTA 1	11
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Encofrado, ferralla y hormigonado pilares in situ	5
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	3
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	3
Colocación de fachadas	2
PLANTA 2	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
PLANTA 3	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas pasillo	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
PLANTA 4	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
PLANTA 5	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
PLANTA 6	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
PLANTA 7	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
CUBIERTA	7
Colocación de doble muro estructural	2
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	2
Colocación de escaleras	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	2
Colocación de fachadas	2
CASETONES	2
Colocación de doble muro estructural	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	1
Colocación de vigas	1
Colocación de forjados y vigas de fachada	1
Ferralla, hormigonado y trabajos auxiliares in situ	1
